

Termo de Abertura de Projeto (TAP)

Esse template foi construído pelo seguindo práticas recomendadas de gerenciamento de projetos e diretrizes do **Guia PMBOK** (Project Management Body of Knowledge), do Project Management Institute. Mas, você pode customizar de acordo com as necessidades do seu projeto.

Nome do Projeto: Pixelate.

Gestor do Projeto: Murilo Pessoni Cândido

Orçamento: R\$ 100.000,00

Prazo do projeto: 27/06/2026

Última revisão da TAP: 01/04/2026

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Porque o projeto deve ser realizado. Quais são os problemas que ele irá resolver? Exemplo:

A organização e divulgação de eventos ainda depende amplamente de meios informais como grupos de WhatsApp, publicações em redes sociais e e-mails avulsos, o que dificulta o controle de inscrições e o alcance do público-alvo. O Pixelate surge como uma solução centralizada para criação, divulgação e gestão de eventos, oferecendo aos organizadores ferramentas de controle e aos participantes uma experiência de inscrição simples e acessível.

OBJETIVOS

Que valor o projeto busca obter? Tente usar metas SMART. Você pode elencar mais de um objetivo! Exemplo:

Desenvolver e entregar uma plataforma web funcional para gestão de eventos até 27/06/2026, com funcionalidades de cadastro, inscrição, avaliação e busca de eventos.

Implementar banco de dados não relacional (MongoDB) com ao menos 5 coleções estruturadas, garantindo flexibilidade e escalabilidade da aplicação.

Disponibilizar uma interface responsiva e intuitiva, reduzindo a curva de aprendizado do usuário a menos de 5 minutos para realização de uma inscrição.

PRODUTO E REQUISITOS

Descreva o que será a entrega final e quais são seus principais requisitos. Exemplo:

Desenvolvimento de uma aplicação web com banco de dados não relacional (MongoDB), onde o usuário poderá cadastrar eventos, editar, avaliar e inscrever. Haverá um filtro de pesquisas para facilitar o acesso, além de divulgação de fotos dos eventos.

MARCOS

Liste, em tópicos, quais são os principais momentos do projeto. Também são conhecidos como *milestones*. Exemplo:

- Levantamento e especificação dos requisitos do sistema
- Migração do banco de dados de MySQL para MongoDB
- Desenvolvimento do back-end (rotas, autenticação, lógica de negócio)
- Desenvolvimento do front-end (templates EJS, estilização e responsividade)
- Implementação das funcionalidades principais (inscrição, vagas, avaliação, painel do organizador)
- Integração e testes com usuários reais
- Documentação técnica finalizada
- Entrega final do projeto

PREMISSAS

Suposições que precisam ser consideradas no projeto. Exemplo:

- Os membros da equipe terão disponibilidade semanal suficiente para cumprir o cronograma
- Haverá acesso estável à internet para uso de serviços externos
- O ambiente de desenvolvimento será padronizado entre os membros da equipe (Node.js, MongoDB local ou Atlas)
- O projeto será hospedado em ambiente de testes para validação antes da entrega

EQUIPE

Membro	Cargo	Responsabilidade
Francisco Rodrigues	Desenvolvedor	Desenvolver o back-end
Marcelo Moraes	Desenvolvedor	Documentação do projeto
Murilo Pessoni	Desenvolvedor	Desenvolver o front-end/PO

RESTRIÇÕES

Limites já conhecidos que podem impactar o projeto em termos de orçamento e prazo. Exemplo:


- Prazo limitado para a entrega do projeto
- Requisitos de conformidade e segurança rigorosos

RISCOS

Mapeamento dos riscos que podem acontecer durante o projeto. Exemplo:


- Atrasos no desenvolvimento
- Não atender os requisitos do projeto
- Não funcionamento da integração
- Falhas de segurança e conformidade de dados

KanBan do Projeto:

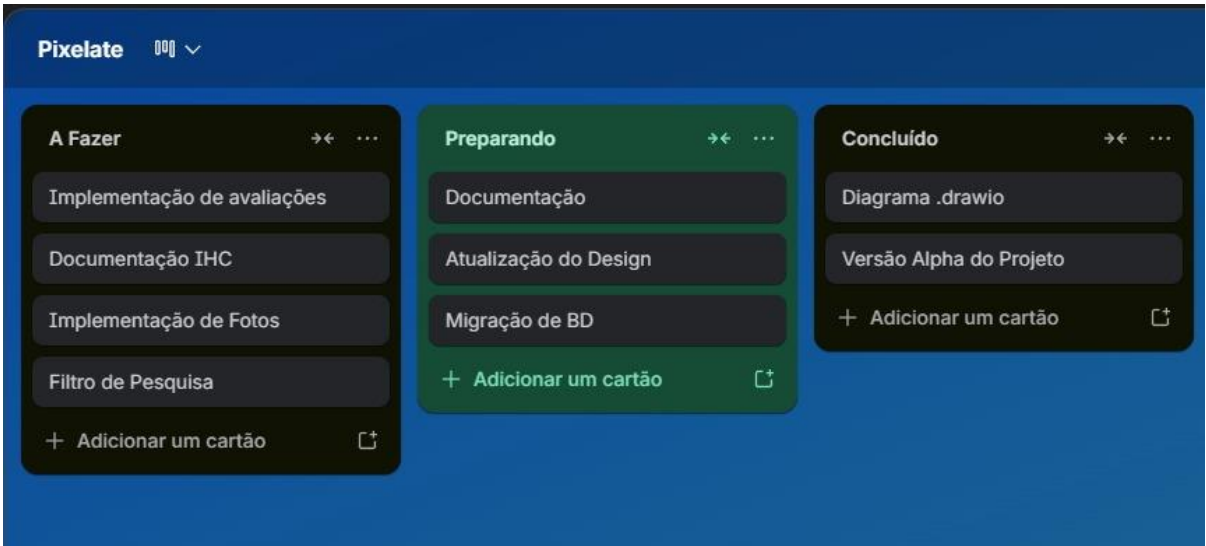

1.

Pert/CPM:

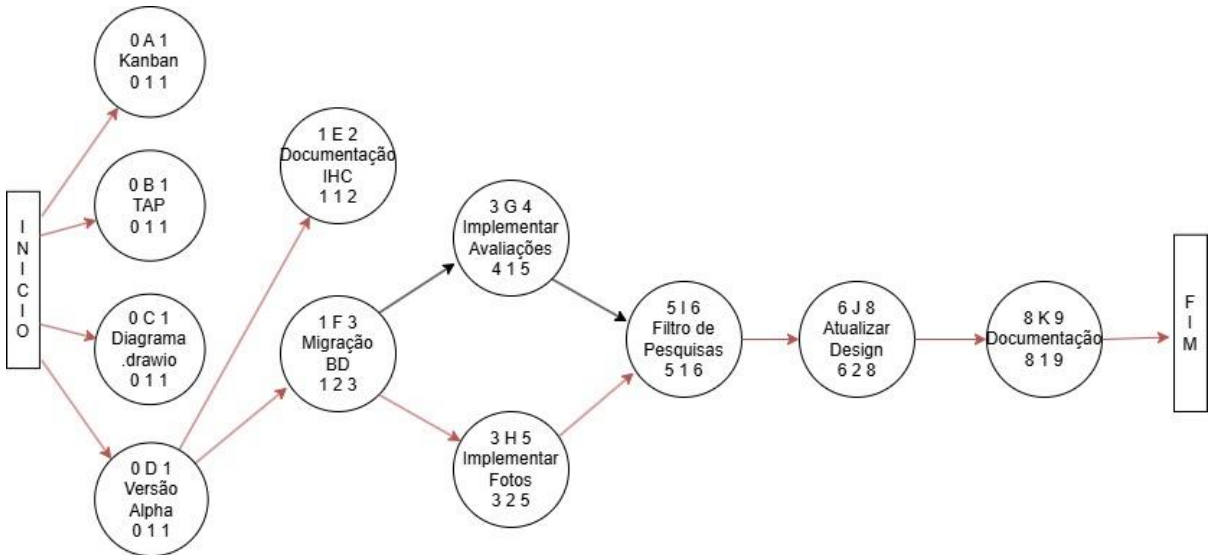

Planejamento e Organização de Tarefas:

Atividades	Descrição	Precedentes	Prazo (Semanas)
A	Kanban	-	1
B	TAP	-	1
C	Diagrama .drawio	-	1
D	Versão Alpha	-	1
E	Documentação IHC	D	1
F	Migração do BD	D	2
G	Implementação de Avaliações	F	1
H	Implementação de Fotos	F	2
I	Filtro de Pesquisas	G, H	1
J	Atualização do Design	I	2
K	Documentação do Projeto	J	1

Scrum do projeto (Parte 1):

Mapeamento das Partes Interessadas: Clientes (pagantes):

Jovens que vão consumir a experiência (ingressos, consumo no local, etc.).
Usuários finais: os próprios frequentadores do espaço/experiência (podem coincidir com os clientes, mas aqui foca na experiência deles). Equipe organizadora/desenvolvedores: responsáveis por planejar, criar e executar o projeto (você e possíveis parceiros). Administrador do sistema/plataforma: quem gerencia reservas, vendas online, controle de entrada, etc. Parceiros e fornecedores: DJs, artistas, fornecedores de bebida, equipamentos de som/iluminação. Empresa/empreendedor responsável: você (ou sua marca), que idealiza e banca o projeto. Comunidade local: moradores e comércios próximos que podem ser impactados pelo funcionamento do espaço. Órgãos reguladores: prefeitura, vigilância sanitária, bombeiros (liberação de alvará, segurança, etc.).

Product Backlog: Cadastro de usuários;

- * Login de usuários;
- * Cadastro de eventos;
- * Edição e exclusão de eventos;
- * Busca de eventos por nome;
- * Filtro de eventos por categoria;
- * Inscrição em eventos;
- * Cancelamento de inscrição;
- * Lista de eventos inscritos;
- * Avaliação de eventos.

Histórias de Usuário (User Stories): Como usuário, quero criar uma conta no sistema para acessar os recursos da plataforma.

- Como usuário, quero buscar eventos por categoria e localização para encontrar eventos do meu interesse.
- Como usuário, quero me inscrever em eventos para participar das atividades disponíveis.
- Como organizador, quero cadastrar eventos na plataforma para divulgar minhas atividades aos usuários.
- Como organizador, quero editar informações dos eventos para manter os dados atualizados.

Como organizador, quero visualizar avaliações de participação para acompanhar o desempenho dos meus eventos.

Planejamento da Sprint: Nome da Sprint:

Sprint 1 – Validação da Ideia e Protótipo Inicial

Objetivo da Sprint:

Validar a proposta do Pixelate com o público-alvo e desenvolver um protótipo inicial da experiência.

Funcionalidades que serão desenvolvidas primeiro:

Definição do conceito do evento/experiência;

Criação de identidade visual básica;

Protótipo de página (ou rede social) para divulgação;

Formulário de interesse com usuários;

Planejamento inicial da experiência (ambiente, música, proposta).

Tempo estimado da Sprint:

2 semanas

Responsável por cada tarefa:

Pesquisa com usuários: Francisco

Criação da identidade visual: Murilo

Protótipo (página/redes sociais): Marcelo

Planejamento da experiência: Murilo e Francisco

Organização geral da Sprint: Marcelo

Reunião Daily Scrum (Simulação): A simulação representa um momento do projeto durante a fase de desenvolvimento do back-end e migração para MongoDB.

Francisco

1. Finalizou a modelagem dos schemas Mongoose para as coleções de usuários e eventos, e configurou a conexão com o MongoDB Atlas.
2. Implementar as rotas de autenticação e iniciar a lógica de inscrição em eventos com controle de vagas.
3. Aguarda a definição visual das telas de cadastro para alinhar os campos do formulário com os do schema.

Murilo

1. Atualizou o TAP com as revisões solicitadas e iniciou o registro das decisões técnicas tomadas nas últimas sprints.
2. Documentar as rotas da API desenvolvidas pelo Francisco e preparar o relatório de progresso para a próxima entrega.
3. Nenhum impedimento no momento, mas depende do back-end estar estável para documentar as rotas com precisão.

Marcelo

1. Criou os templates React.js das páginas de listagem e detalhes de eventos, aplicando a estilização base em CSS.
2. Desenvolver o formulário de criação de eventos com upload de imagem de capa e integrar com as rotas do back-end.

3. A integração depende das rotas estarem disponíveis; está alinhando com o Francisco o prazo para isso.

Valores do Scrum do Projeto:

Coragem

A equipe demonstra coragem ao assumir a migração completa do banco de dados de MySQL para MongoDB, uma decisão técnica que impõe desafios reais dentro de um prazo fixo. Também há coragem em apontar impedimentos abertamente nas dailys, sem omitir dependências ou dificuldades que possam comprometer o andamento do projeto.

Foco

Com prazo definido até 27/06/2026 e uma equipe de três pessoas, o foco é essencial. A equipe prioriza as funcionalidades centrais da plataforma — cadastro, inscrição, avaliação e painel do organizador — e evita desvios de escopo que não agreguem valor direto à entrega.

Comprometimento

Cada membro possui responsabilidades claras e complementares: back-end, front-end e documentação. O comprometimento se manifesta no respeito a essas divisões e na garantia de que nenhuma área trave o avanço das demais, especialmente em pontos de integração.

Respeito

A equipe reconhece as limitações individuais de tempo e conhecimento, sem cobranças desproporcionais. As decisões técnicas são tomadas de forma colaborativa, valorizando a contribuição de cada integrante independentemente do papel que ocupa na sprint.

Abertura

A abertura se aplica tanto à transparência sobre o andamento real das tarefas quanto à receptividade a mudanças de requisitos. A equipe mantém o TAP atualizado e documenta as decisões tomadas ao longo do projeto, garantindo que todos os membros — e o orientador — tenham visibilidade sobre o estado atual do desenvolvimento.

Scrum do projeto (Parte 2):

Por que o SCRUM seria importante nesse projeto?

O SCRUM é importante para o projeto Pixelate porque ajuda a organizar melhor o desenvolvimento do sistema, dividindo as tarefas em etapas menores e mais fáceis de acompanhar. Com isso, a equipe consegue trabalhar de forma mais organizada, melhorar a comunicação entre os integrantes e entregar funcionalidades aos

poucos. Além disso, a metodologia facilita correções e melhorias durante o projeto, tornando o desenvolvimento mais eficiente e flexível.

Quais seriam os benefícios do SCRUM para o projeto?

O SCRUM traria vários benefícios para o projeto Pixelate, principalmente na organização e no desenvolvimento do sistema. A metodologia ajuda a dividir melhor as tarefas entre os integrantes da equipe, melhorando a comunicação e o trabalho em conjunto. Além disso, permite entregas mais rápidas das funcionalidades, facilitando testes e correções ao longo do projeto. Outro benefício importante é o maior controle sobre o andamento do desenvolvimento, garantindo que a equipe acompanhe o progresso e consiga realizar melhorias de forma contínua.

Quais dificuldades a equipe poderia enfrentar?

Equipe reduzida: Com apenas três integrantes, ausências ou sobrecarga de trabalho podem impactar o cronograma. Além disso, o Product Owner também atua no front-end, acumulando responsabilidades.

Migração do banco de dados: A mudança de MySQL para MongoDB exige uma nova modelagem de dados. Decisões inadequadas nessa etapa podem gerar retrabalho futuramente.

Integração front-end e back-end: Diferenças entre o que o front-end espera e o que o back-end implementa podem causar problemas na integração, exigindo alinhamento constante da equipe.

Prazo e escopo: O grande número de funcionalidades planejadas, aliado ao prazo limitado, pode dificultar a entrega completa do projeto com a qualidade desejada.

Curva de aprendizado: O uso de tecnologias como React, MongoDB/Mongoose e Cloudinary pode demandar tempo de adaptação e aumentar a complexidade do desenvolvimento.

Documentação: Manter a documentação atualizada durante o desenvolvimento é um desafio. Deixar essa tarefa para o final pode comprometer sua qualidade e precisão.

Reflexão Final:

O SCRUM pode melhorar o desenvolvimento do projeto da equipe porque organiza melhor as tarefas e facilita a comunicação entre os integrantes. Com a divisão do projeto em Sprints, a equipe consegue trabalhar de forma mais organizada e acompanhar o progresso das atividades. Além disso, o método ajuda na identificação rápida de problemas, permitindo ajustes durante o desenvolvimento.

No projeto Pixelate, o SCRUM contribui para que cada integrante tenha funções bem definidas e saiba exatamente suas responsabilidades. As reuniões e acompanhamentos frequentes ajudam a manter todos alinhados com os objetivos do projeto. Outro ponto importante é a flexibilidade, já que a equipe pode adaptar ideias e melhorias com base nos feedbacks recebidos do público-alvo. Dessa forma, o SCRUM aumenta a produtividade, melhora a colaboração entre os membros e contribui para o desenvolvimento de um projeto mais eficiente e organizado.

Perguntas Referente ao Projeto:

Por que o projeto é necessário?

O Pixelate é necessário para oferecer aos usuários uma nova opção de lazer e interação social a partir da promoção de eventos na qual o usuário poderá se inscrever ou criar um evento.

Como o projeto ajudará a resolver os problemas identificados pela organização?

Ajudará para a promoção do evento do usuário criador que não sabe muitas vezes onde divulgar seu próprio evento, assim como usuários que procuram um evento menor, algo mais "underground" ou só não sabem onde procurar, além de trazer uma experiência diferente e aproximação do público.

Qual a solução recomendada?

O Pixelate foi criado para ser a solução da falta de eventos e organizadores no mesmo site, facilitando divulgação, criação e participação, com uma experiência interativa com foco em entretenimento e conexão entre pessoas.

Quais os benefícios esperados?

Atrair o público, facilitar a divulgação de informações e as criações de novos eventos.

O que vai ou pode ocorrer ao negócio, se a solução não for implementada?

A equipe pode perder a oportunidade de desenvolver a ideia e alcançar o público.

Quando a solução será implementada? E os recursos necessários?

Será implantado por etapas. Recursos: equipe, computadores, internet e ferramentas de divulgação.
